




A1=1:250
A3=1:500

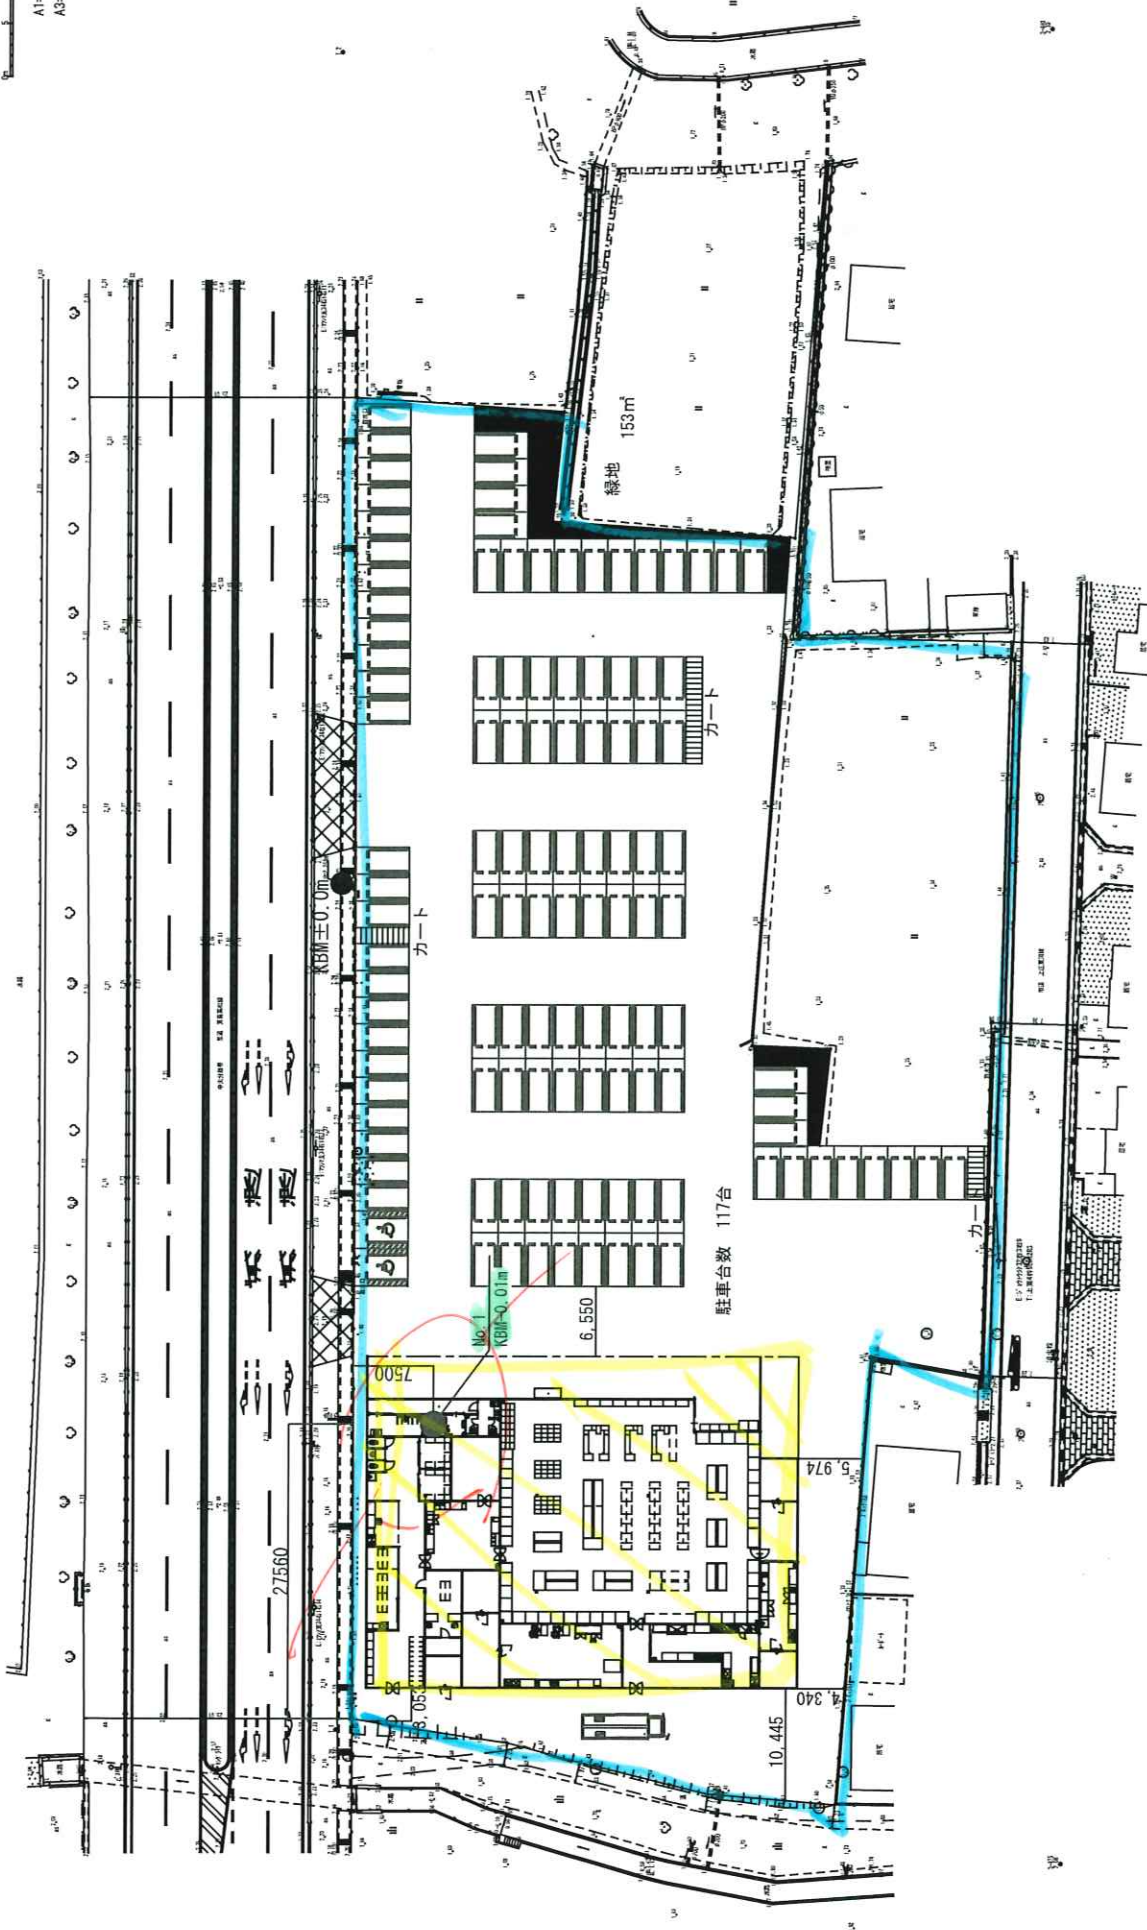

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)なかやま牧場下庄店新築工事

[illegible]

事業・工事名


シート No

ボーリング名	No. 1			調査位置		岡山県倉敷市上東地内										北緯		34° 38' 48.16"								
発注機関	吉元建設株式会社						調査期間		令和 4年 5月 18日 ~ 4年 5月 20日						東経		133° 49' 57.92"									
調査業者名	大和ランテック株式会社 中四国支店 電話 (086-242-3410)						主任技師		佐藤 英 貴		現 場 代 理 人		岩 山 大 介		コ ン 鑑 定 者		石 原 慎 一 郎		ボーリング 責 任 者		濱 本 隆 志					
孔 口 標 高	KBM -0.010m		角		180° 上		90°		方		北 0° 270°		地盤勾配		鉛直 水平 0°		使用機種		試 錐 機		TOHO DO-C		ハンマー 落下用具		半自動落下装置	
総掘進長	21.25m		度		下 0°		向		西 180° 東		向		エンジン		YANMAR TF90V		ポンプ		TOHO BG-3C							

[illegible]

適用式	建築基礎構造設計指針式 (2019)			
調査生名	(仮称) なかやま牧場下庄店新築工事			
調査住所				
調査位置	北緯:34度38分48.16秒 東経:133度49分57.92秒			
ボーリング名	No.1			
孔口標高	KBW-0.01(m)			
地下水位	GL-1.07(m)			
液化指数PI(加速度)	3.389(2.000m/s ²)			
非液化化層厚H1	11.000(m)			
低減係数	0.015			
計算対象範囲	地下水位以深で、FC≦35% FC>35%かつ (粘土分含有率≦10%またはIP≦15)			

標高	計算深度	N値	γ _t	σ _v	σ _{v'}	D50	FC	IP	PC	砂礫地盤補正係数	補正N値	R	L	FL	γ _{cy}	H	低減係数
m	(m)	(回)	(kN/m ³)	(kN/m ²)	(kN/m ²)	(mm)	(%)		(%)							(m)	β
+	1	1.300	3.00	21.55	19.30												
-5	2	2.300	3.00	37.55	25.50												
-10	3	3.300	9.00	53.65	31.80		9.90			1.000	21.841	0.280	0.213	1.315			
-15	4	4.325	0.86	71.25	39.35												
	5	5.250	0.00	86.05	45.09												
	6	6.250	0.00	102.05	51.29												
	7	7.300	17.00	119.65	58.60		3.10			1.000	22.208	0.292	0.241	1.211			
	8	8.300	24.00	137.65	66.80		3.10			1.000	29.365	0.920	0.239	3.846			
	9	9.300	19.00	155.65	75.00		3.10			1.000	21.940	0.283	0.237	1.194			
	10	10.300	19.00	173.65	83.20		3.10			1.000	20.831	0.250	0.234	1.070			
	11	11.300	9.00	191.65	91.40		7.20			1.000	12.054	0.144	0.231	0.623	2.0	0.800	0.270
	12	12.300	10.00	209.65	99.60		7.20			1.000	12.660	0.148	0.228	0.650	2.0	1.000	0.295
	13	13.300	16.00	227.65	107.80		7.20			1.000	18.051	0.198	0.224	0.881	0.5	1.100	0.672
	14	14.300	14.00	245.65	116.00		21.40			1.000	21.139	0.259	0.221	1.172			
	15	15.300	47.00	264.25	124.80												
	16	16.300	50.00	283.25	134.00												
	17	17.300	24.00	302.25	143.20												

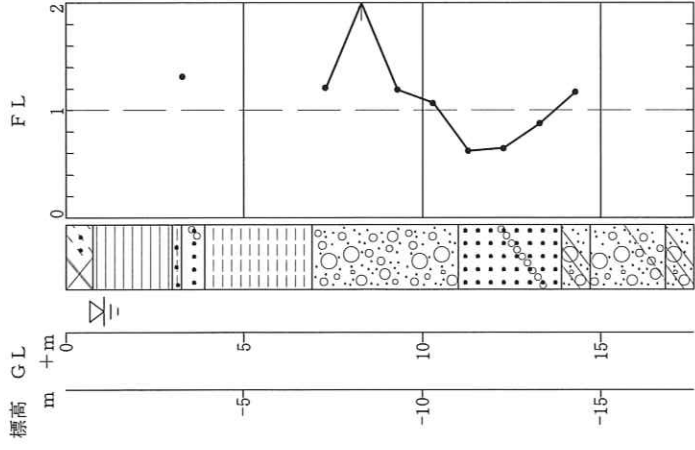

PL

1.64
1.35
0.4

④ 13.39
